

EDIFICACIONES CARELY S.A DE C.V
ECA1206209E5

CERRADA DE PUEBLA N° Ext.23 Col.PROGRESO
CP.39350,ACAPULCO DE JUAREZ,GUERRERO,México Régimen
fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: ECA60
Lugar de expedición: 39350
Fecha comprobante: 2018-09-20T13:57:36
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO

RFC: MJG040211PN7

Domicilio: MORELOS N° Ext.424 Col.CENTRO CP.41920,JUCHITAN,GUERRERO,MEXICO

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Moneda : MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Tipo de relación: - UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
72151500	1	E48 - Unidad de	RECIBI DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN,GRO A TRAVES DEL FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES 2018 1 , LA CANTIDAD DE \$ 590, 842.24 (QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION # 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO; CON EL NUMERO DE CONTRATO: MJG-DOP-PROGRAMAS REGIONALES-2018-1-I	511,551.72	511,551.72

Subtotal	511,551.72
Descuento	0.00
IVA (16) %	81,848.28
5% AL MILLAR 0.5%	2,557.76
Total	590,842.24

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-20T13:59:49

Folio fiscal: 39A11FA5-6170-411D-B25D-5D95245DAAD2

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409208587

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|39A11FA5-6170-411D-B25D-5D95245DAAD2|2018-09-20T13:59:49|TSP080724QW6|FoQXC3RTfEnETIPGm17kxNy4Rid5zeBRuTfw48c7L8H
Wb26PexfuPxxHij2O958kXhEDrWuVcaPcshvkmkVPJkRHZOVW5aMKc+3kn5rtkgXWz20gslRhkUG0xe1FfwxThVvKQJqnLhOLN7dIU61DmuEuNMpHw4aKoKkpl
3Cn3EXJTL9FhVViUOhyxQAA4DiPBrt1qUVjhUuEmycWbRT8241yAgaCBrtKJuwjy67O7y4zQF5dyu7PEBycWNU5fmqyK07ydo08xkjl9R1oiOOXAZLmM5jin
OxdTQvG76pMgstH0GEvnsO4B+K5j0Zgd33F24Ee7EpiQcUtpGNV1FAkFw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:



FoQXC3RTfEnETIPGm17kxNy4Rid5zeBRuTfw48c7L8Hw526PexfuPxxHij2O958kXhEDrWuVcaPcshvkmkVPJkRHZOVW5aMKc+3kn5rtkgXWz20gslRhkUG0xe1FfwxThV
kQJqnLhOLN7dIU61DmuEuNMpHw4aKoKkpl3Cn3EXJTL9FhVViUOhyxQAA4DiPBrt1qUVjhUuEmycWbRT8241yAgaCBrtKJuwjy67O7y4zQF5dyu7PEBycWNU5fmqyK07y
do08xkjl9R1oiOOXAZLmM5jinOxdTQvG76pMgstH0GEvnsO4B+K5j0Zgd33F24Ee7EpiQcUtpGNV1FAkFw==

Sello digital del SAT:

k734mwBjY17+fNAPwJDJlosbhlvtAyleJnisaUsdUUY8S1IX5Og7ihMfyK5648CfkO1Q6XR2mZahUvkkLW0Nfow-djM7jU6xrszcC6r18Fw6cKTBcoHFO0MewkibRdRP9D
MTg:tfN2RqEAv9XSQg0JwJNYTgc3nX1qvp7zzXNRYXERqxb1eRm1DbtcGtQR30VWgdN/A1DSMhOhIZwQ/TGW/TPVVp/Q780mIPKQj82IODvjDD5CA00Z6P1pSxiFci
BiL2X6rohR032pOp8TIHgYPwZi8V0IZwfq7gDwQSSuILTwt48ZYJsb/Xe47n+ieDpNS6UuC668iXXOgA==

Emitido por: **FACTUR@**
Ases de México S.A. de C.V.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO. PERIODO 2015 - 2018

E S T A D O D E C U E N T A		ESTIMACION No. 3 (TRES Y FINIQUITO)
OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO EN LA UBICACIÓN: JUCHITAN		ESTADO: GUERRERO
LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.		DEL: 02/07/2018
CONTRATISTA: C-SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ		AL: 15/09/2018
IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA		IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)
\$1,978,000.01		\$0.00

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	RETENCION 2% AL ESTADO	5% AL MILLAR INSP. DE OBRAS	2% AL MILLAR C.M.I.C.	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1(UNO)	02 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2018	\$ 682,068.97	\$ 109,131.04		\$ 3,410.34	\$ -	\$ -	\$ 3,410.34	\$ 787,789.67
2(DOS)	18 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2018	\$ 511,551.72	\$ 81,848.28		\$ 2,557.76	\$ -	\$ -	\$ 2,557.76	\$ 590,842.24
3(TRES Y FINIQUITO)	13 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$ 511,551.72	\$ 81,848.28		\$ 2,557.76	\$ -	\$ -	\$ 2,557.76	\$ 590,842.24
TOTAL		\$1,705,172.41	\$272,827.60	\$0.00	\$8,525.86	0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$1,181,684.48
SALDO		\$0.00			SALDO POR AMORTIZAR	0.00	\$0.00		



CONTRATISTA
C. SANDRA LUZ CORTES OTERO

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. GUANAYZEL TORNEZ OTERO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
JUCHITAN, GRO.

TESORERIA
JUCHITAN, GRO.

TESORERO MUNICIPAL
FRANCISCO CARMONA SORIANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE JUCHITAN, GRO.
2015 - 2018
PRESIDENTE
JUCHITAN, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ALFONSO AQUILERO SORIANO ZAVALA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

E S T I M A C I Ó N

OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.		ESTIMACION No. 3 (TRES Y FINIQUITO)	
CONTRATISTA: C. SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ		ESTADO: GUERRERO	DEL: 02/07/2018
UBICACION: JUCHITAN		AL: 15/09/2018	
PERIODO EST: 13 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		M/J-G-DOP-PROGRAMAS REGIONALES-2018-1-1	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES			IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ACUMULADO	
A 01	TRABAJOS PRELIMINARES						
ALU-01	TRAZO Y LOCALIZACION DE POSTE PARA LUMINARIO PARA DISTRIBUCION EN CAMELLON	ML	\$ 13.25	813.74	0.00	0.00	\$0.00
ALU-02	EXCAVACION EN TERRENO TIPO I POR MEDIOS MANUALES PARA BASE DE CONCRETO TRONCOPIRAMIDAL, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1 METRO.	PZA	\$ 898.51	26.00	0.00	0.00	\$0.00
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES						\$0.00
A02	OBRA COMPLEMENTARIA						
ALU-03	FABRICACION E INSTALACION EN SITIO, DE BASE DE CONCRETO TRONCOPIRAMIDAL CON ACERO DE REFUERZO Y ANCLAS PARA POSTE DE 9 METROS	PZA	\$ 8,368.31	26.00	0.00	0.00	\$0.00
	PARADO Y PLOMEADO DE POSTE						\$0.00
A03	PLOMEADO Y PARADO DE POSTES						
ALU-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 9 METROS, SOBRE BASE TRONCOPIRAMIDAL, INCLUYE: ACARREOS, PARADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 9,100.52	26.00	0.00	0.00	\$0.00
	TOTAL DE PARADO Y PLOMEADO DE POSTES						\$0.00
A04	INSTALACION DE LUMINARIAS						
ALU-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR ALL IN ONE, PARA ALUMBRADO PUBLICO, MOD. DE LED SOLAR STREET DE 40 W, DE POTENCIA, CHIP PHILIPS, 6,400.	PZA	\$ 23,400.76	52.00	0.00	52.00	\$1,216,839.52
	TOTAL DE INSTALACION DE LUMINARIAS						\$511,551.72
	TOTAL DE ESTA ESTIMACION						\$511,551.72

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2015-2018
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 JUCHITAN, GRO.

CONTRATISTA:
 C. SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ

SUPERVISOR:
 ING. DIANA ITZEL TORNEZ OTERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
 ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I O N		EST. No. 3 (TRES Y FINIQUITC)
OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.		ESTADO: GUERRERO
CONTRATISTA: C.SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ	UBICACIÓN: JUCHITAN	DEL: 02/07/2018
	CONTRATO	
	PERIODO EST	AL: 15/09/2018
		MJG-DOP-PROGRAMAS REGIONALES-2018-1-1
		13 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A 01	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ -
A 02	OBRA COMPLEMENTARIA	\$ -
A 03	PLOMEADO Y PARADO DE POSTES	\$ -
A 04	INSTALACION DE LUMINARIAS	\$ 511,551.72
TOTAL DE PARTIDAS:		\$ 511,551.72
SUBTOTAL:		\$ 511,551.72
UNID. IVA:		\$ 81,848.28
TOTAL:		\$ 593,400.00

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: **(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

AVANCE FISICO:

 CONTRATATA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
 TESORERIA JUCHITAN, GRO.
 TRESORERO MUNICIPAL

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR: 70.00%
 AVANCE FINANCIERO ACTUAL: 30.00%
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
AVANCE FINANCIERO TOTAL: 100.00%
 PRESIDENTE MUNICIPAL JUCHITAN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO. PERIODO 2015 - 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.		NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-PROGRAMAS REGIONALES-2018-1-I
UBICACIÓN: JUCHITAN	PERIODO DE ESTIMACION:	
CONTRATISTA: C.SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ	13 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	ESTIMACION: 3(TRES Y FINIQUITO)

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	%	SUBTOTAL	CANTIDAD
A04	OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. INSTALACION DE LUMINARIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR ALL IN ONE PARA ALUMBRADO PUBLICO MOD DE LED SOLAR STREET DE 40 W DE POTENCIA, CHIP PHILIPS 6.400 LUMENES CON 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE: PANEL FOTOVOLTAICO, SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ATENUACION Y CUIDADO DE LA BATERIA, FOTO CENSOR (FOTOCELDA), BATERIA LUMINARIO DE LED, MATERIAL DE SOPORTERIA, FLETE HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION Y MANO DE OBRA.				PIEZA			52.00			52.00	52.00
PARA ESTA ESTIMACION SE TOMO LA CANTIDAD DE 21.86 PIEZAS QUE ES EL TOTAL DE 52 PIEZAS												



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
DIRECCION
OBRAS PUBLICAS
JUCHITAN, GRO.


SUPERVISOR:
ING. DIANA HUEL ORNEZ OTERO


CONTRATISTA:
C. SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.		NO. DE CONTRATO: MJG-DOP-PROGRAMAS REGIONALES-2018-1-I	
UBICACIÓN:	JUCHITAN	PERIODO DE ESTIMACION:	
CONTRATISTA:	C. SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ	13 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	ESTIMACION No: 3 (TRES Y FINIQUITO)

CROQUIS

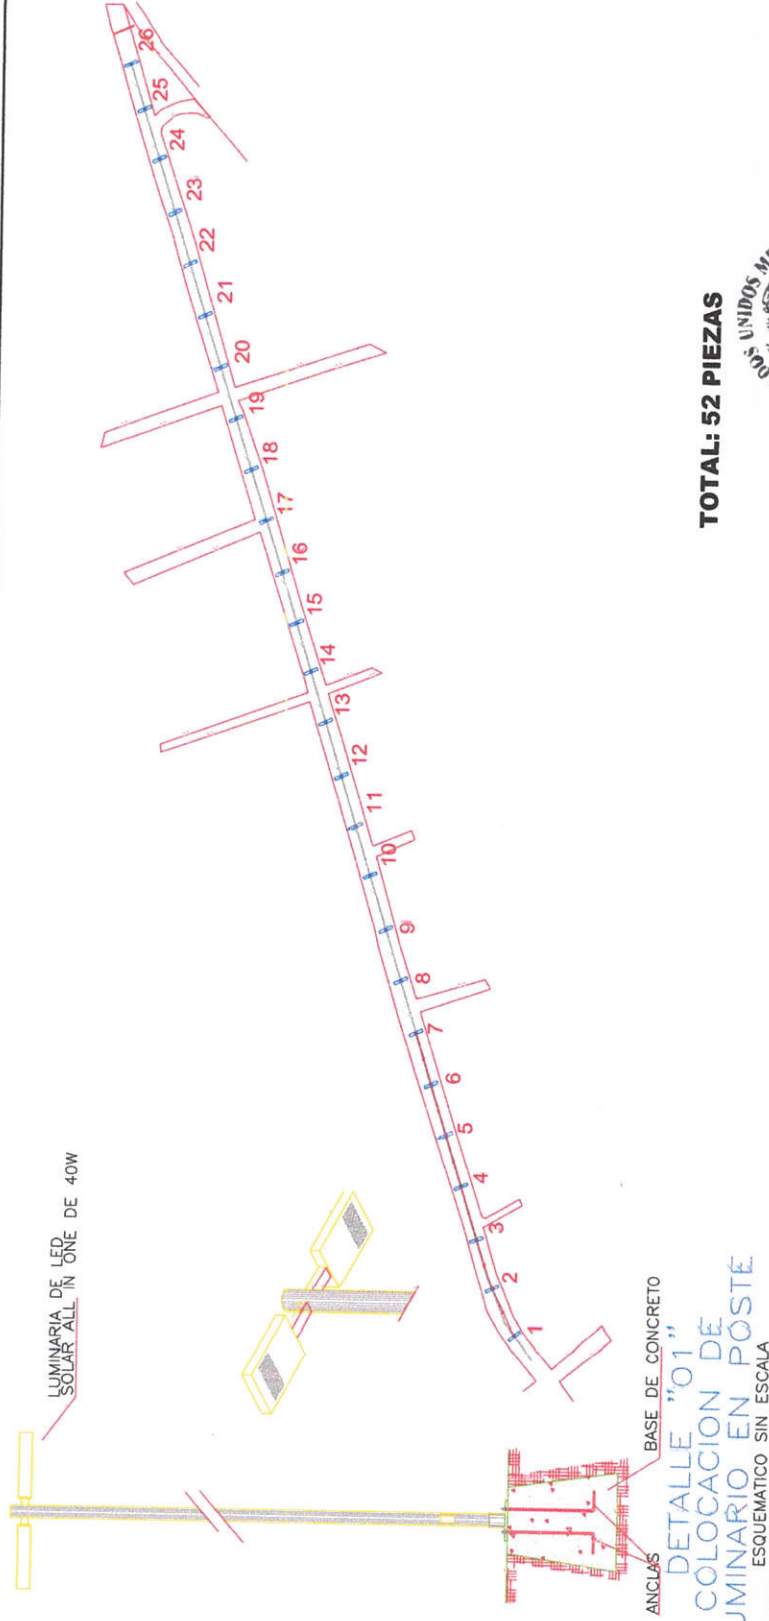

TOTAL: 52 PIEZAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR ALL IN ONE, PARA ALUMBRADO PUBLICO, MOD. DE LED SOLAR STREET DE 40 W DE LUMINANCIA, CHIP PHILIPS 6.400 LUMENES CON 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE: PANEL FOTOVOLTAICO, SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ATENUACION Y CUIDADO DE LA BATERIA, FOTO CENSOR (FOTOCELDA), BATERIA, LUMINARIO DE LED, MATERIAL DE SOPORTERIA, FLETE HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION Y MANDO DE OBRAS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018 DIRECCION OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.

Supervisor: ING. DIANA ITZEL TORNEZ OTERO

Director de Obras Publicas: ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

CONTRATISTA: C. SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

CONTROL DE ESTIMACIONES		EST. No. 3 (TRES Y FINIQUITO)
OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.		ESTADO: GUERRERO
CONTRATISTA: C.SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ		DEL: 02/07/2018
UBICACIÓN: JUCHITAN		AL: 15/09/2018
CONTRATO		MJG-DOP-PROGRAMAS REGIONALES 2018-1-1
PERIODO EST		13 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE AGOSTO DEL 2018
MONTO DE CONTRATO		MONTO DE ANTICIPO
\$1,978,000.01		\$0.00
ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA		
LIQUIDACION		
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$	511,551.72	ESTA ESTIMACION: \$ 593,400.00
IVA (16%): \$	81,848.28	ACUMULADO ANTERIOR: \$ 1,384,600.01
TOTAL: \$	593,400.00	ACUMULADO TOTAL: \$ 1,978,000.01
DEDUCCIONES		
AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$	-	SALDO POR AMORTIZAR: \$ 0.00
INSPECCION DE OBRAS 5 AL MILLAR: \$	2,557.76	AVANCE EN EL PERIODO: 300.00%
CMIC CAPAC 2 AL MILLAR: \$	-	AVANCE ANTERIOR: 70.00%
TOTAL DEDUCCIONES: \$	2,557.76	AVANCE GENERAL DE LA OBRA: 370.00%
LIQUIDO A PAGAR:	\$ 590,842.24	AVANCE FINANCIERO
IMPORTE CON LETRA:		
(QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100VN.)		
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.		PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018 PRESIDENTE JUCHITAN, GRO.
CONTRATISTA ING. SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ		TESORERO MUNICIPAL FRANCISCO CARMONA SOBRIANO JUCHITAN, GRO.
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS ING. DIANATZEL TORNEZ OTERO		PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. ALFONSO ACHULES SOBRIANO ZAVALETA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.



PERIODO 2015 - 2018

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXEDENTES			N° DE ESTIMACION	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CONSTRUCCION DE ALBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.		ESTIMACION N° 3 (TRES Y FINIQUITO)													
UBICACION		JUCHITAN			JUCHITAN			02 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018			CONTRATISTA: SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ			N° DE CONTRATO: MJG-DOP-PROGRAMAS REGIONALES-2018-1-1	
MUNICIPIO		JUCHITAN			JUCHITAN			02 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018			MUNICIPIO			MONTO CONTRATADO \$ 1,978,000.01	
CONCEPTO		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN JOSE.													
A 01	TRABAJOS PRELIMINARES														
ALU-01	TRAZO Y LOCALIZACION DE POSTES PARA LUMINARIO PARA DISTRIBUCION EN CAMELON	ML	81374	\$ 13.25	10,782.06	814	13.25	\$ 10,782.06	-	-	-	0	\$ 13.25	\$ -	ESTIMACION I(UNO)
ALU-02	EXCAVACION EN TERRENO TIPO I POR MEDIOS MANUALES PARA BASE DE CONCRETO TRONCOFARMIDAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1 METRO.	PZA	26.00	\$ 898.51	23,361.26	26	898.51	\$ 23,361.26	-	-	-	0	\$ 898.51	\$ -	ESTIMACION I(UNO)
A 02	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES														
OPERA COMPLEMENTARIAS															
ALU-03	SETIDO DE BASE DE CONCRETO TRONCOFARMIDAL CON ACERO DE REFUERZO Y ANCLAS PARA POSTE DE 9 METROS.	PZA	26.0000	\$ 8,368.31	\$ 217,576.06	26	8,368.31	\$ 217,576.06	-	-	-	0	\$ 8,368.31	\$ -	ESTIMACION I(UNO)
A 03	TOTAL DE OBRA COMPLEMENTARIA														
PLOMEADO Y PARADO DE POSTES															
ALU-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 9 METROS SOBRE BASE TRONCOFARMIDAL INCLUYE: ACABADOS PARA O MATERIAL EQUIPO HE BRAMIENTA Y AMANO DE OBRA.	PZA	26	\$ 9,100.52	236,613.52	26	9,100.52	\$ 236,613.52	-	-	-	0	\$ 9,100.52	\$ -	ESTIMACION I(UNO)
A 04	TOTAL DE VESTIDO DE ESTRUCTURA														
INSTALACION DE LUMINARIAS															
ALU-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SOLAR ALL IN ONE PARA ALUMBRADO PUBLICO MOD. BELED SOLARS TREET DE 40 W DE POTENCIA, CHEP PHILIPS 6-400 LUMENES CON 5 AÑOS DE GARANTIA INCLUYE: PANEL FOTOVOLTAICO SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ATENUACION Y CUIDADO DE LA BATERIA FOTO SENSOR (FOTOCELDA) BATERIA LUMINARIO DE LED MATERIAL DE	PZA	52	\$ 23,400.76	1,216,839.52	52	23,400.76	\$ 1,216,839.52	-	-	-	0	\$ 23,400.76	\$ -	ESTIMACION I(UNO)
TOTAL DE LA REABILITACION DE LA RED															
TOTAL SIN IVA															
MAS 15% DE IVA															
TOTAL CON IVA															
TOTAL DE LA REABILITACION DE LA RED															
TOTAL SIN IVA															
MAS 15% DE IVA															
TOTAL CON IVA															



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018 DIRECCION OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.

SUPERVISOR:
ING. DIANALIZEL TORNEZ OTERO

CONTRATISTA:
C. SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBRADO PUBLICO SOLAR EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.	MUNICIPIO	JUCHITAN	ESTIMACION N° 3 (TRES Y FINIQUITO)	CONTRATISTA: SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ	N° DE CONTRATO: MJG-DOP-PROGRAMAS REGIONALES- 2018-1-I
UBICACIÓN	JUCHITAN	JUCHITAN	JUCHITAN	PERIODO DE EJECUCION	02 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018	MONTO CONTRATADO \$ 1,978,000.01

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXEDENTES			N° DE ESTIMACION	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
A01	TRABAJOS PRELIMINARES			\$			\$								
A02	PARADO Y PLOMEADO			\$			\$								
A03	VESTIDO DE ESTRUCTURA			\$			\$								
A04	RETENIDA			\$			\$								
	TOTAL DE REHABILITACION DE LA RED.			\$			\$								
	IVA 16%			\$			\$								
	TOTALES CON IVA			\$			\$								
RESUMEN															
				CONTRATADO	ESTIMADOS			NO EJECUTADOS			EXEDENTES				
				34,143.32	\$		34,143.32	\$							
				217,576.06	\$		217,576.06	\$							
				236,613.52	\$		236,613.52	\$							
				1,216,839.52	\$		1,216,839.52	\$							
				1,705,172.42	\$		1,705,172.42	\$							
				272,827.59	\$		272,827.59	\$							
				1,978,000.00	\$		1,978,000.00	\$							



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
DIRECCION OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.

SUPERVISOR:
ING. JUANITZEL TORNEZ OTERO

CONTRATISTA:
C. SANDRA LUZ CORTES RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ
